

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Retrofit Edifício Hasse — Grupo DVA

Nº do RDO	056-140926
Obra	Retrofit Edifício Hasse (Contrato CT/PC-DVA-2026-01)
Data	14/09/2026
Empreiteiro	Edi Carlo
Mestre de Obras	Carlos
Acompanhamento técnico	A2E Engenharia Estrutural e Elétrica
Origem da informação	Mensagens de voz, texto e fotos via WhatsApp, transcritas e organizadas pela A2E

1. Ocorrência de Campo

09h11 — Vazamento no relógio d'água (cavalete) da entrada


O mestre de obras Carlos relatou, por áudio, que o relógio d'água (cavalete) da entrada amanheceu vazando: a peça está quebrada, com saída considerável de água. Sinalizou a necessidade de contato com a administração do prédio para o reparo.



Vazamento no relógio d'água (cavalete) da entrada — 09h11

09h58–11h15 — Comunicação à DVA e abertura de chamado na Casan

A A2E comunicou o Sr. Helio Filho (Grupo DVA) sobre o vazamento identificado no cavalete da unidade (Rua Heriberto Haase, 50). Chamado registrado no portal da Casan às 11h08 (protocolo 14/09/2026 11h08 900701, situação: solicitação recebida). O Sr. Helio confirmou o recebimento e agradeceu o aviso.

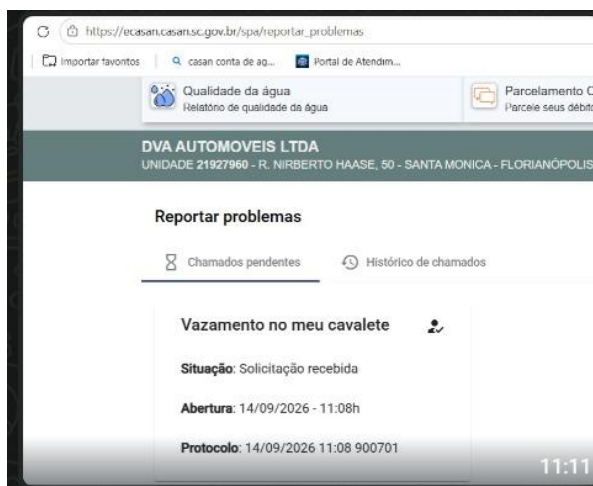

Protocolo de chamado aberto na Casan — 11h08

2. Atividades Executadas — Hoje**09h32 — Derrubada da platibanda existente (face lateral)**

Início da demolição da platibanda existente na face lateral do edifício. Material sendo puxado para dentro do pavimento e lançado posteriormente para fora.



Derrubada da platibanda existente — face lateral — 09h32

10h56 — Entulho da platibanda no corredor lateral

Entulho da demolição da platibanda acumulado no corredor lateral do terreno, aguardando remoção.



Entulho da demolição da platibanda no corredor lateral — 10h56

3. Aquisição de Materiais

Madeira Gilmar — Orçamento 17512

Descrição	Qtde.	VL. Unit.	VL. Total
P. Caixaria 7,5 x 3m	24	R\$ 8,00	R\$ 192,00
P. Caixaria 30 x 3m	4	R\$ 33,50	R\$ 134,00
Total líquido			R\$ 326,00

Pagamento: PIX em 14/09/2026, 10h26, pago por F2 Assessoria e Consultoria em Negócios Ltda para Madeira Serviços de Cobranças Ltda (chave +5548984774310); tarifa bancária de R\$ 4,73 à parte. Confirmado por comprovante bancário.

4. Previsão para Amanhã

- Início da construção da platibanda em blocos CCA, no trecho lateral já demolido.

5. Confirmações de Campo

Vazamento no cavalete: comunicado ao Grupo DVA (Sr. Helio Filho) e chamado aberto na Casan às 11h08 (protocolo 14/09/2026 11h08 900701).

Derrubada da platibanda (face lateral): concluída, com remoção do material e limpeza do corredor lateral, registrada em fotos às 09h32 e 10h56.

Aquisição de materiais: Madeireira Gilmar, R\$ 326,00 pago via PIX (10h26), confirmado por comprovante bancário.

Engenharia com responsabilidade.
