

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)


Retrofit Edifício Hasse — Grupo DVA

Nº do RDO	071-300926
Obra	Retrofit Edifício Hasse (Contrato CT/PC-DVA-2026-01)
Data	30/09/2026
Empreiteiro	Edi Carlo
Mestre de Obras	Carlos
Acompanhamento técnico	A2E Engenharia Estrutural e Elétrica
Origem da informação	Fotos e relatos da equipe A2E via WhatsApp, organizados pela A2E

1. Atividades Executadas — Hoje


08h40–10h00 — Visita técnica à oficina DVA RAM/JEEP

Visita técnica à oficina da DVA RAM/JEEP, com a Eng. Civil Adriane Szekut e o Rogério, pela A2E, e Dionatan e Juliano, pela DVA. Foram analisados os sistemas de iluminação e de lavação, como referência para o estudo de uma área do mesmo tipo prevista no Edifício Hasse.

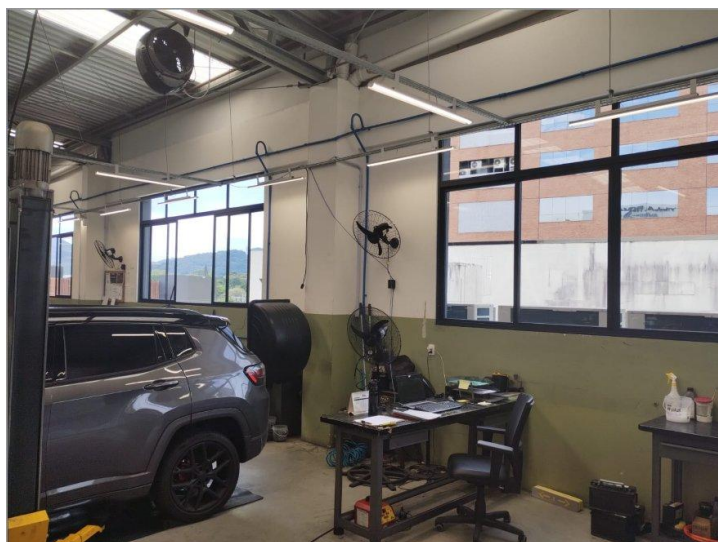

Oficina DVA RAM/JEEP — área de trabalho e janelas laterais

Iluminação. Análise visual, comparando o ambiente com as luminárias apagadas e acesas. Com as luminárias apagadas, piso, paredes e veículos permaneceram bem iluminados no horário da visita: a luz natural entra pelas janelas laterais e pelas telhas de polycarbonato. Com as luminárias acesas, a diferença visível foi pequena. A conclusão é qualitativa — as fotos são de celular, sem medição em lux. A quantificação depende de medição com luxímetro no plano de trabalho.

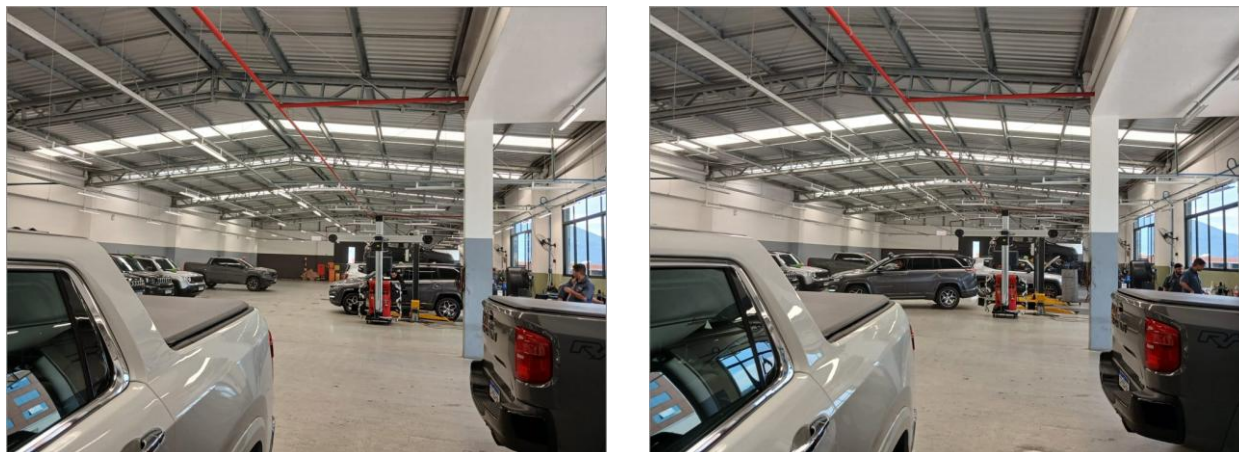


Comparativo de iluminação — luminárias acesas (esq.) e apagadas (dir.)

Lavação. Levantada a bomba de alta pressão do sistema de lavação: Annovi Reverberi RCA 3.5G25, bomba volumétrica alternativa com três pistões de cerâmica e cabeçote em latão forjado, para aplicações semi-industriais e de lavagem profissional. Opera acoplada a motor elétrico trifásico de 1.750 rpm, com pressão máxima de 170 bar (2.500 psi), potência exigida de 4 kW (5,5 cv) e comando por chave de partida direta trifásica (380 V / 7–10 A). Consumo estimado em operação nominal:

Período de uso	Consumo de água (L)	Consumo elétrico estimado (kWh)
1 minuto	13,2	0,07
10 minutos	132	0,67
11 min 22 s	150	0,76
30 minutos	396	2,00
1 hora (60 min)	792	4,00

Estimativa: vazão de ~13,2 L/min deduzida da referência de 150 L em 11 min 22 s; consumo elétrico calculado com a potência nominal de 4 kW. O consumo real pode variar com o rendimento do motor acoplado e com o ajuste do descarregador/pressostato (unloader valve).

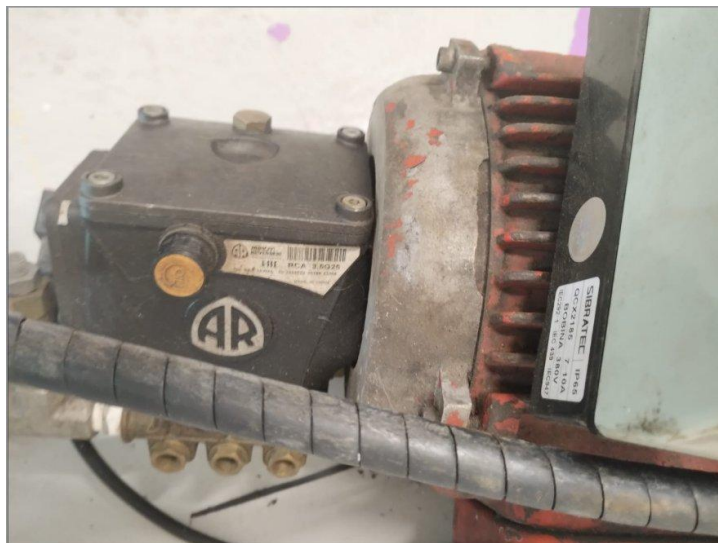

Bomba da lavação da DVA - JEEP/RAM

10h15 — Explicação técnica na laje (CCA)


Na laje, com o Dionatan (DVA), a Eng. Civil Adriane Szekut e o Rogério (A2E) fizeram a explicação técnica sobre o CCA e a técnica construtiva com espuma ou argamassa. Também foi explicado o acabamento executado com massa acrílica direta sobre o CCA.



Dionatan e Eng. Civil Adriane Szekut na laje — 10h15

15h29 — Primeira entrega do telhado metálico (Multimetal)


O caminhão da Multimetal fez a primeira entrega de peças do telhado metálico. A entrega é parcial. O descarregamento foi feito com o braço articulado do caminhão.

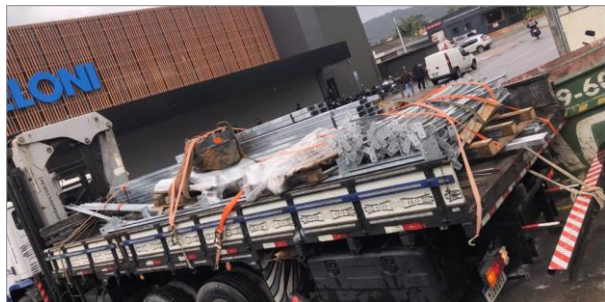

Caminhão da Multimetal com a carga, junto ao Angeloni




Caminhão na entrada da edificação (esq.) e descarregamento com o braço articulado (dir.)

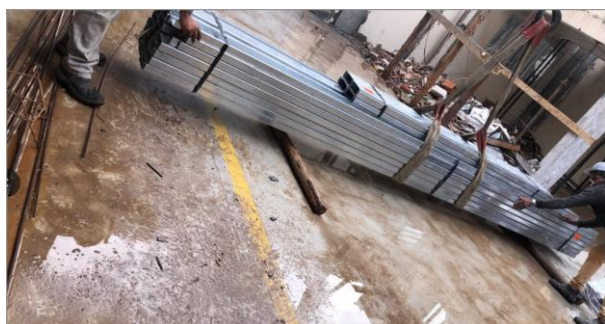

Feixes de perfis metálicos: sobre o piso (esq.) e içado no interior da edificação (dir.)



Peças metálicas galvanizadas no recipiente de transporte

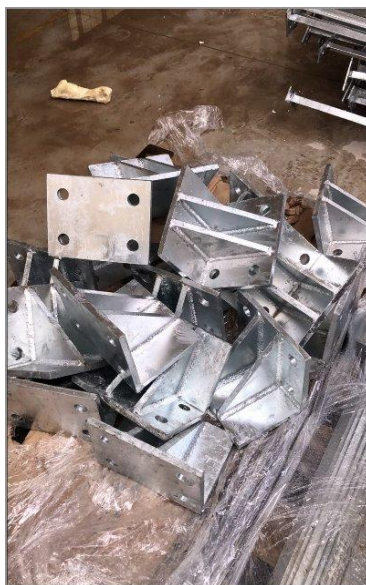

Peças de base galvanizadas, com enrijecedores



Feixe de chapas galvanizadas perfuradas, estocado

2. Previsão para Amanhã

- Sem previsão definida.

3. Confirmações de Campo

- Visita técnica à oficina DVA RAM/JEEP realizada das 08h40 às 10h00, com Adriane e Rogério (A2E) e Dionatan e Juliano (DVA).
- Iluminação: análise visual e qualitativa; a quantificação depende de medição em lux.
- Bomba de lavagem: consumos de água e de energia são estimativas, conforme nota do item 1.
- Telhado metálico: primeira entrega (parcial) realizada pela Multimetal.

Relatório elaborado a partir de fotos e informações enviadas pela equipe A2E via WhatsApp ao longo do dia 30/09/2026, organizadas e formatadas pela A2E.

Engenharia com responsabilidade.
